Minecraft Spielplatz Buchenberg - Basis

Nr.	Vorg.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Geplanter Anfang	Geplantes Ende
1		Projektstart	0 Tage	Die 01.04.25	Die 01.04.25		2	Die 01.04.25	Die 01.04.25
2		Vergabe Planungsleistung	4 Wochen	Mon 19.05.25	Fre 13.06.25	1	3	Die 01.04.25	Mon 28.04.25
3		LP 1 - Grundlagenermittlung	5 Wochen	Mon 16.06.25	Fre 18.07.25	2	4	Die 29.04.25	Mon 26.05.25
4		LP 2 - Vorplanung	6 Wochen	Mon 21.07.25	Fre 29.08.25	3	5	Die 27.05.25	Mon 07.07.25
5		Erstellung Drucksache LP 2	1 Woche	Mon 01.09.25	Fre 05.09.25	4	6	Die 08.07.25	Mon 14.07.25
6		DS Entscheidungsvorlage LP 2	2 Wochen	Mon 08.09.25	Fre 19.09.25	5	7EA+5 Tage	Die 15.07.25	Mon 28.07.25
7		Einreichung Unterlagen	0 Tage	Fre 26.09.25	Fre 26.09.25	6EA+5 Tage		Mon 04.08.25	Mon 04.08.25
8		Vorberatung DBOB	0 Tage	Don 02.10.25	Don 02.10.25		9	Mon 11.08.25	Mon 11.08.25
9		Anhörung Ortsteilrat Melchendorf	0 Tage	Mit 29.10.25	Mit 29.10.25	8	10	Mit 10.09.25	Mit 10.09.25
10		Entscheidung DBOB	0 Tage	Don 30.10.25	Don 30.10.25	9	11	Mit 10.09.25	Mit 10.09.25
11		LP 3 - Entwurfsplanung	8 Wochen	Don 30.10.25	Mit 24.12.25	10	12;13	Mit 10.09.25	Die 04.11.25
12		Baufachliche Prüfung TMIL	6 Monate	Don 25.12.25	Mit 10.06.26	11		Mit 05.11.25	Die 21.04.26
13		Erstellung Drucksache LP 3	1 Woche	Don 25.12.25	Mit 31.12.25	11	14	Mit 05.11.25	Die 11.11.25
14		DS Entscheidungsvorlage LP 3	2 Wochen	Don 01.01.26	Mit 14.01.26	13	15EA+5 Tage	Mit 12.11.25	Die 25.11.25
15		Einreichung Unterlagen	0 Tage	Mit 21.01.26	Mit 21.01.26	14EA+5 Tage	16EA+6 Tage	Die 02.12.25	Die 02.12.25
16		Vorberatung DBOB	0 Tage	Die 27.01.26	Die 27.01.26	15EA+6 Tage	17	Don 04.12.25	Don 04.12.25
17		Anhörung Ortsteilrat Melchendorf	0 Tage	Don 12.02.26	Don 12.02.26	16	18	Don 15.01.26	Don 15.01.26
18		Entscheidung DBOB	0 Tage	Fre 13.02.26	Fre 13.02.26	17	19	Fre 16.01.26	Fre 16.01.26
19		LP 4 - Genehmigungsplanung	6 Wochen	Fre 13.02.26	Don 26.03.26	18	20	Fre 16.01.26	Don 26.02.26
20		LP 5 - Ausführungsplanung	8 Wochen	Fre 27.03.26	Don 21.05.26	19	21	Fre 27.02.26	Don 23.04.26
21		LP 6 - Vorbereitung der Vergabe	6 Wochen	Fre 22.05.26	Don 02.07.26	20	22	Fre 24.04.26	Don 04.06.26
22		LP7 - Mitwirkung bei der Vergabe	6 Wochen	Fre 03.07.26	Don 13.08.26	21	23	Fre 05.06.26	Don 16.07.26
23		LP 8 - Objektüberwachung	12 Monate	Fre 14.08.26	Don 15.07.27	22		Fre 17.07.26	Don 17.06.27

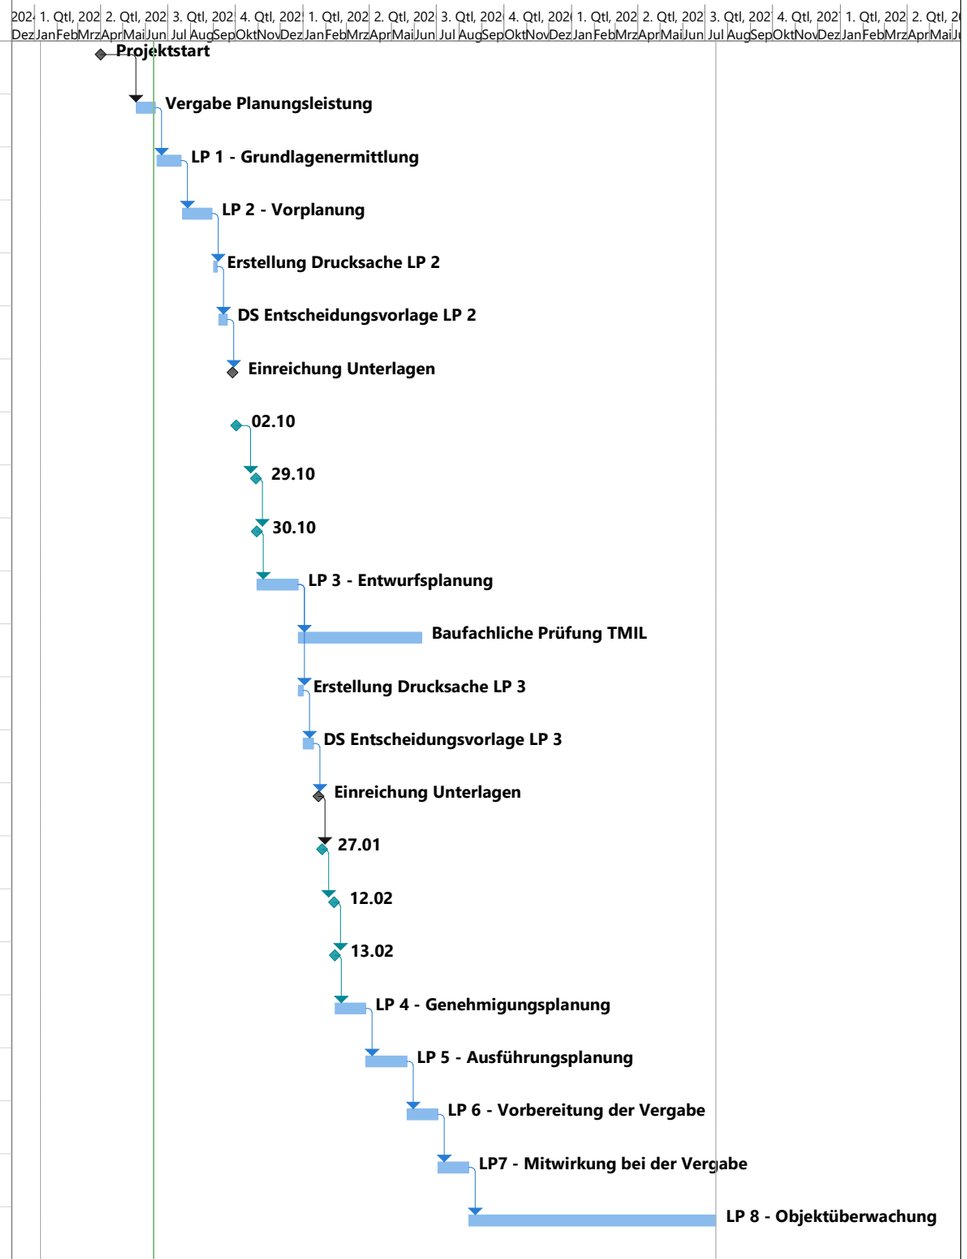

Projekt: Umfeld Judohalle
Datum: Don 12.06.25

Vorgang | Sammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Nur Dauer | Nur Anfang | Externer Meilenstein | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Projektsammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Ende | Stichtag
Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvorgang | Externe Vorgänge | In Arbeit
